

**HOTĂRÂREA nr.21**

privind aprobarea **Raportului privind evaluarea stadiului fizic si tehnico-financiar la lucrarile executate la obiectivul de investitie „ Modernizare prin asfaltare drumuri in comuna Probota, judetul Iasi,, realizat de Societatea Mariodoro Proiect SRL Iași .**

Consiliul Local al Comunei Probota, județul Iași, legal constituit conform Ordinului nr.323/26.10.2020 al Prefectului județului Iasi, întrunit la lucrarile ședinței extraordinare-convocata de indata- din data 25 februarie 2022 ;

Având în vedere:

- referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat sub nr.1279/25.02.2022 ;

-avizul Comisiei de specialitate -Comisia economica, din cadrul Consiliului Local Probota;

- Contractul de finantare nr. 6736/23.10.2014 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind investitia „ Modernizare prin asfaltare drumuri în Comuna Probota, județul Iași “,

- Contractul de servicii nr. 4091/14.08.2015 încheiat cu SC RDV Construct S.R.L privind investitia “ Modernizare prin asfaltare drumuri în Comuna Probota, județul Iași,

- Contractul de servicii nr.1/02.08.2019 încheiat cu Societatea Mariodoro Proiect SRL Iași privind incheierea unui raport privind evaluarea stadiului fizic si tehnico-financiar la lucrarile executate la obiectivul de investitie “ Modernizare prin asfaltare drumuri în Comuna Probota, județul Iași”.

-Raportul privind evaluarea Stadiului fizic si tehnico-financiar la lucrarile executate la obiectivul de investitie „ Modernizare prin asfaltare drumuri in comuna Probota, judetul Iasi ”,, cu nr. 4788/26.08.2019, realizat de Societatea Mariodoro Proiect SRL Iași

- Decizia Camerei de conturi jud. Iasi, nr.134/2015, pentru obiectivele de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala ;

Avand in vedere prevederile Partii a III-a, Titlul V, cap. VIII, art. 129 ,aliniat 1-2, litera (c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**In temeiul Partii a III-a, Titlul V, cap. VIII, art. 196, aliniat 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;**

**HOTĂRĂȘTE :**

Art.1 Se aproba **Raportul privind evaluarea stadiului fizic si tehnico-financiar la lucrarile executate la obiectivul de investitie „ Modernizare prin asfaltare drumuri in comuna Probota, judetul Iasi,, realizat de Societatea Mariodoro Proiect SRL Iași, conform Anexei nr.1, parte integranta la acesta.**

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției și se va comunica, în termenul legal, către:

- Primarul comunei Probota, , județul Iași;

- Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Probota, județul Iași;

- Camerei de Conturi a jud. Iasi ;

- Instituției Prefectului Județului Iași în vederea exercitării controlului de legalitate

Art.3 Cu ducerea la indeplinirea prezentei se insarcineaza primarul comunei Probota, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu .

Data astăzi, 25.02.2022

Președinte de ședință  
Consilier local,  
Bucur Ioan



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 143  
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,  
Secretar, Nica Valentin

**PROCEDURI OBLIGAORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL nr.\_21 /25.02.2022**

Nr. Crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data ZZ/L L/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectuee procedura
	Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate <u>X</u> simpla / absoluta / calificata	25.02.2022	
	Comunicarea catre primarul comunei Probota	25.02.2022	
	Comunicarea catre prefectul judetului Iasi	25.02.2022	
	Aducerea la cunostinta publica	25.02.2022	
	Comunicarea,numai in cazul celei cu caracter indiviual	-	
	Hotarare devine obligatorie,sau produce efecte juridice,dupa caz	comunicare	

**RAPORT DE EVALUARE A CANTITATILOR DE LUCRARI  
EXECUTATE SI DECONTATE LA INVESTITIA:  
„Modernizare prin asfaltare drumuri în comuna Probota, județul Iași”.  
conform contract nr.9/31.07.2019**

Evaluarea s-a facut in perioada 02.08.2019-26.08.2019, iar la baza verificarilor au stat

- proiectul tehnic si detaliile de executie
- caietele de sarcini
- graficul de executie al lucrarilor
- situatiile de lucrari aprobate de dirigintii de santier la plata (20 buc)
- dispozitiile de santier (4 buc)
- masuratorile in teren

Deoarece masuratorile cu metrul si roata metrica erau interpretabile datorita formelor neregulate ale racordarilor de drum, supralargirilor, drumurilor laterale, santurilor si acostamentelor de beton, s-a cerut efectuarea unei masuratori topo de precizie ridicata insusite de topometrist prin stampila si semnatura. In baza acestor masuratori sau facut interpretarile ulterioare ale cantitatilor de lucrari efectuate si decontate.

Masuratorile s-au facut la lucrarile vizibile si masurabile, pentru lucrarile ascunse (grosimi+calitate materiale folosite) raspunde dirigintele de santier prin PVLA si PVRC.

In urma analizei documentelor puse la dispozitie s-au intocmit centralizatoare pe toate cele 3 tronsoane de drum supuse analizei in care s-au prezentat cantitatile ofertate, realizate si decontate la data verificarii de catre Curtea de Conturi (iulie 2016) si la data incheierii contractului de verificare (august 2019) de catre Marioodoro SRL

Raportul este insotit de 4 pagini/4 tabele centralizatoare+1 pagina cu foto din timpul masuratorilor +masuratori topo AUTOCAD pe suport electronic.

Intocmit,

MARIODORO PROIECT SRL

dr.ing DOROFTEI MARIUS



TRONSON 3		OFERTAT (MP)	REALIZAT Iul 2016	DECONTAT IULIE 2016	VERIFICAT C.CONTURI	+/-	DECONTAT pina in AUG2019	VERIFICAT AUG 2019	decontat fata de oferta	+/- Fata de decontari
LUNGIME DRUM	MP	1032	1045	1032	1045		1032	1045	0	+ 13
STRAT UZURA	MP	4644	4716	4644	-	+72	4644	4716	0	+72
DR. LATERAL +RACORDARI	MP	160	-	160	120	-40	160	320	0	+160
<u>Total uzura</u>		4804					4804	5036	0	+232
PODETE Ø600		4 -1 dis.sant	3	x	3	0	nedecontat	3	rest 3	+3
PODETE Ø1000	BUC	3	-	-	3	0	nedecontat	3	rest 3	+3
Accese proprietati	buc	96 96*4=384mp	-	-	-	-	18+21 =39 39*4=156mp	33 (206mp)	rest 57	- 6 (+50 mp)
Acostamente beton	MC	103	-	-	-	-	103	108 mc 1087 mp	0	+ 5
Sant beton	100m	20.64-3,6 dis.sant =17.04	-	-	-	-	5.36+5.4=10.76	10.45	rest 6.28	- 0.31
Parapet met	ml	0	-	-	-	-	0	50	0	+50
Camine	buc	8			-	-	8	14	0	+ 6
marcaje	KM	1.1	-	-	-	-	nedecontat	1.1	0	0
indicatoare	BUC	10			-	-	10	7	0	- 3

TRONSON 2		OFERTAT (MP)	REALIZAT Iul 2016	DECONTAT IULIE 2016	VERIFICAT C.CONTURI	+/-	DECONTAT 2019	VERIFICAT AUG 2019	decontat fata de oferta	+/- Fata de decontari
LUNGIME DRUM	MP	1408	1462	1408	-		1408	1408	0	+54
STRAT UZURA	MP	5896+440 +580 d.sant =6916	6635	6916	-	+72	6916	6635	0	-281
DRUM LATERAL +RACORDARI	MP	400	-	400	360	-40	400	678	0	+278
<u>Total uzura</u>		6916+400 =7316					7316	7313	0	-3
PODETE Ø600	buc	10-1 (NR)=9	7+1 de10m	9	6	-3	9	7+1+1	0	0
PODETE Ø800	buc	2-1 (NR)=1	1	1	2	+1	1	1	0	0
PODETE Ø1000	buc	1-1 (NR)=0	-	-	0	0	0	0	0	0
Accese proprietati	buc	80 80x4=320mp	16	20	16	-4	55	58 (402mp)	rest 25 buc +82 mp	+3
Acostamente beton	MC	141	-	-	-	-	141	175.2 mc 1752 mp	0	+34.2
Sant beton	100 M	28,16+3,6 (ds) =31.76	-	12.94	8.46	- 4.48	28.76	21.82	rest 3	-6,94
Parapet met	ml	60	-	-	-	-	nedecontat	93	rest 60	+33
Camine	buc	20			-	-	18	20	rest 2	2
marcaje	KM	1.5	-	-	-	-	nedecontat	1.5	0	0
indicatoare	BUC	10			-	-	10	8	0	-2

TRONSON 1		OFERTAT (MP)	REALIZAT Iul 2016	DECONT. IULIE 2016	VERIFICAT C.CONTURI	+/-	DECONTAT iul 2019	VERIFICAT AUG 2019	decontat fata de oferta	+/- Fata de decontari
LUNGIME DRUM	MP	2060	2060	2060	-	-	2060	2060		
STRAT UZURA 2060*4.5=9270	MP	9270+670 (NC)=9940	7898 +1335 =9233	5893+404 7=9940 mp	-	-	9940	7898+1335 = 9233 mp	0	- 707
UZURA DRUM LATERAL +RACORDARI	MP	1040	-	940 ???	940	-100	??/940	1343	Rest 100	+ 403
<u>Total uzura</u>		9940+1040 =10980mp					10880	9415+1343 =10758 mp	100	-304
PODETE Ø600	buc	26-7 (NR)=19	-	19	21	+2	19	19	0	0
PODETE Ø800	buc	5	-	5	4	-1	5	5	0	0
PODETE Ø1000	buc	3	-	3	1	-2 storn 0	1	1	0	0
Accese proprietati	buc	104 104x4=416	4	-	4	+4	67	55 mari 18 mici	rest 37	0
Acostamente beton	mc	206	-	-	-	-	206	280 mc 2797 mp	0	+ 74
Sant beton	100 m	41.20	-	-	4,17	+4.17	15.54	29.22 +3.16 +1.48= 33.86	rest 25,66	+18.32
Parapet met	ml	550	-	-	-	-	550	388	0	-162
Camine	buc	50	-	-	-	-	50	35	0	-15
marcaje	KM	2.1	-	-	-	-	nedecontat	2.1	0	0
indicatoare	BUC	20			-		37	20	0	-17

TOTAL +/-	TRONSON 1	TRONSON 2	TRONSON 3	Total existent fata de decontare totala august 2019
fata de decontari august 2019				
STRAT UZURA DRUM PRINCIPAL	+72	- 281	- 707	- 734
DR. LATERAL +RACORDARI	+160	+278	+ 403	+ 841

<b>Total uzura</b>	<b>+232</b>	<b>-3</b>	<b>-304</b>	<b>-75</b>
PODETE Ø600	+3	0	0	+3
PODETE Ø800	0	0	0	0
PODETE Ø1000	+3	0	0	0
Accese proprietati	-6	+3	0	0
Acostamente beton	+5	+34.2	+74	+113.2
Sant beton	-0.31	-6,94	+18.32	+11.07
Parapet met	+50	+33	-162	-79
Camine	+6	+2	-15	-7
marcaje	0	0	0	0
indicatoare	-3	-2	-17	-22

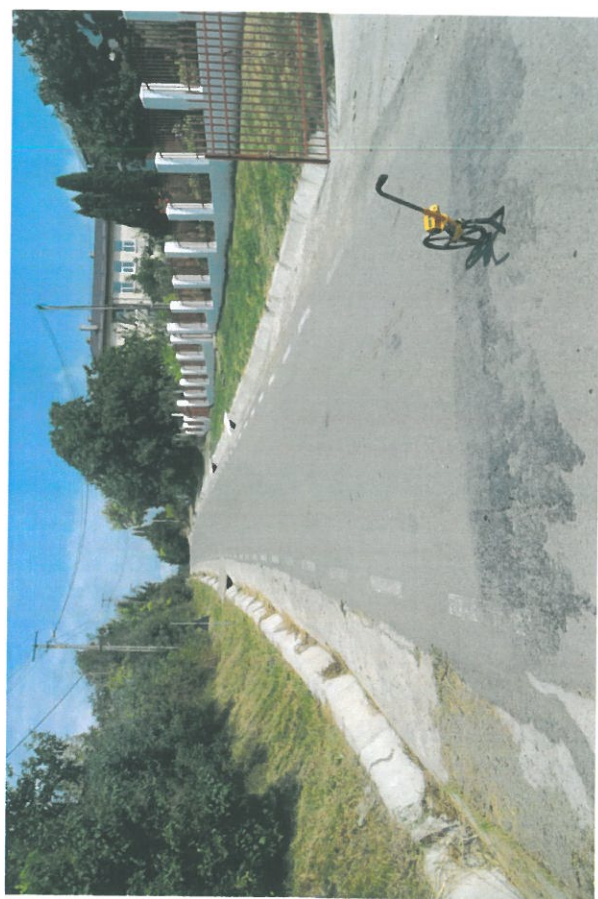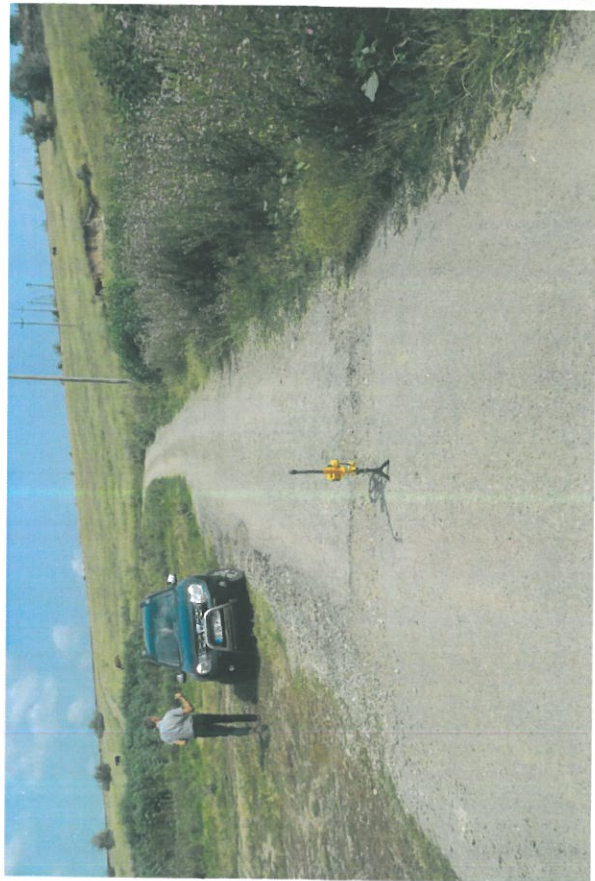



Data astăzi 25.02.2022



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 143  
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,

Secretar general, Nica Valentin
